

G水戸 外階段塗装工事

2020/3/13-3/23


株式会社チャンピオン

現状



塗装はまだ開始していませんが、おそらく前の工事で既にペンキ汚れがありました。

現状

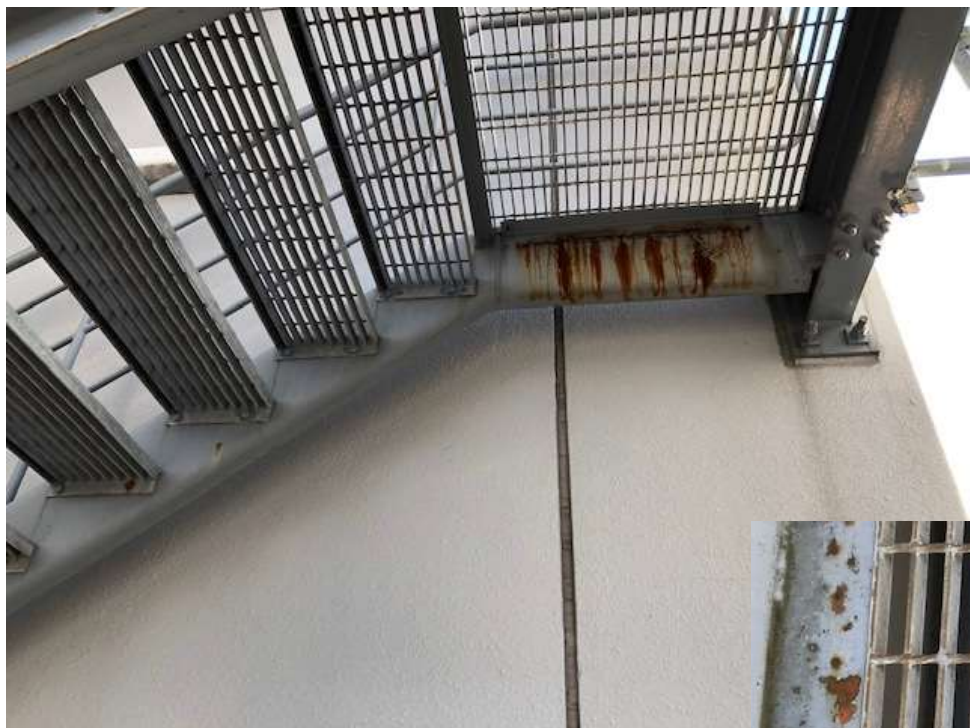

第一工程 足場設置



第一工程 足場設置



水洗い



土汚れや苔を落としました。バリが出てしまっている部分は鑢で削っています。

壁の錆び汚れは、高圧洗浄を施しましたが全く消えていません。その様子を確認頂きたいので別途、動画も添付いたします。

さび止め

塗装部分
Day 2



中塗り

塗装部分
Day 2



中塗り




塗装部分
Day 2

壁側 下塗り

Day 3は雨
で中止

塗装部分
Day 4

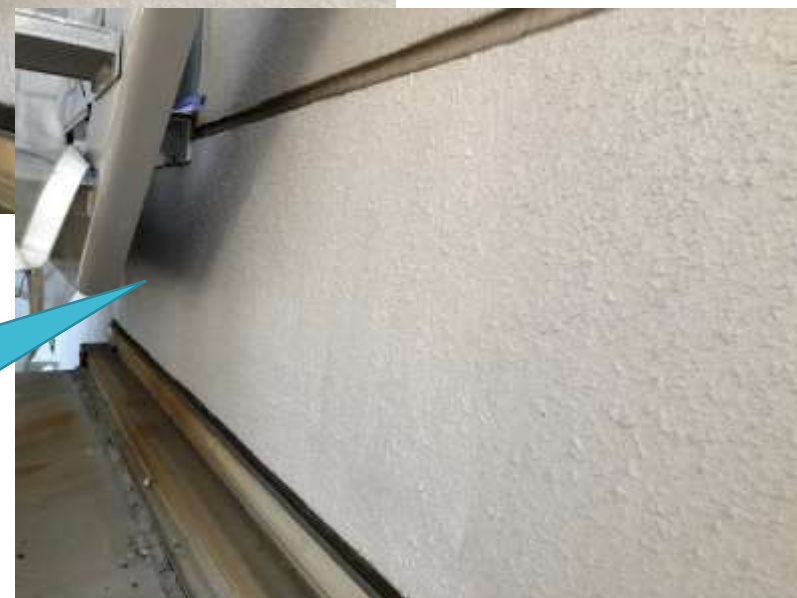

一度乾かせて調色度合いを確認します。少し白く見えますが乾くと少し黒くなります。


壁側 下塗り



一度乾かせて調色度合いを確認します。少し白く見えますが乾くと少し黒くなります。

中塗り

塗装部分
Day 4

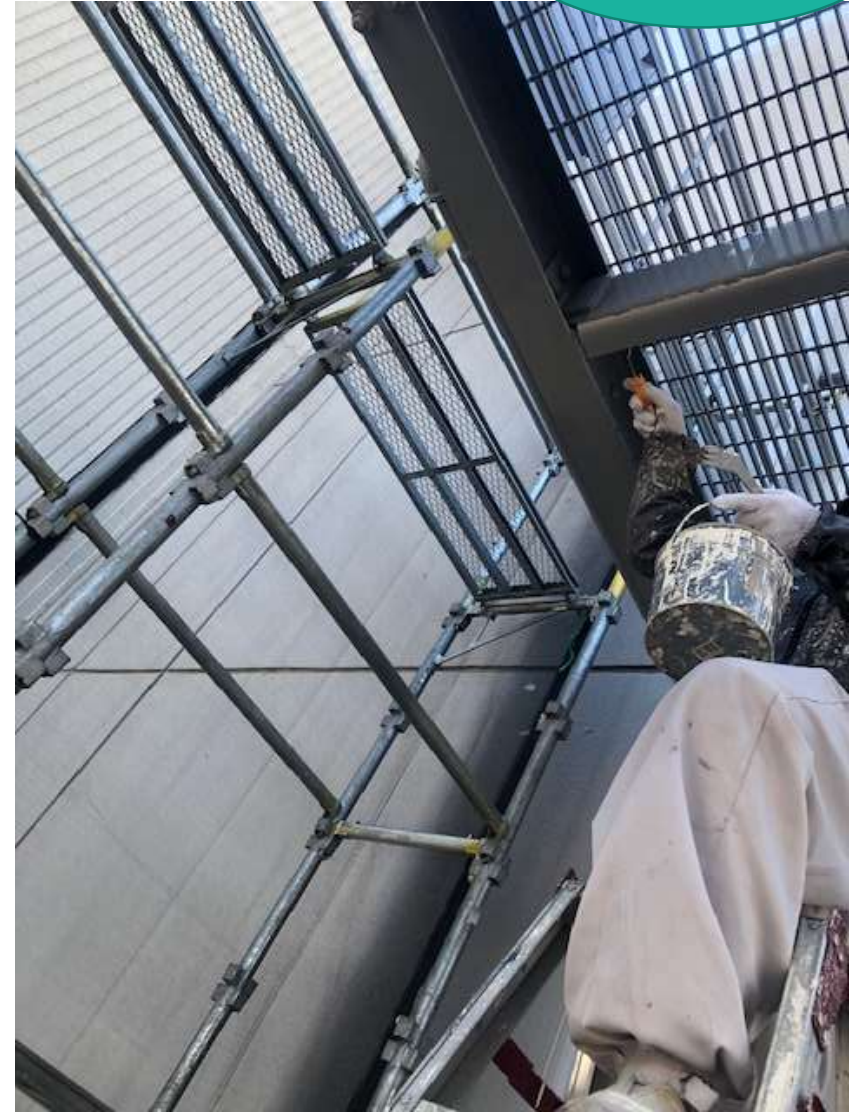

中塗り



車に塗料が飛散しないように
保護カバーを掛けさせて
頂きました。



上塗り

塗装部分
Day 5




現状 (追加分)



追加分



是正分

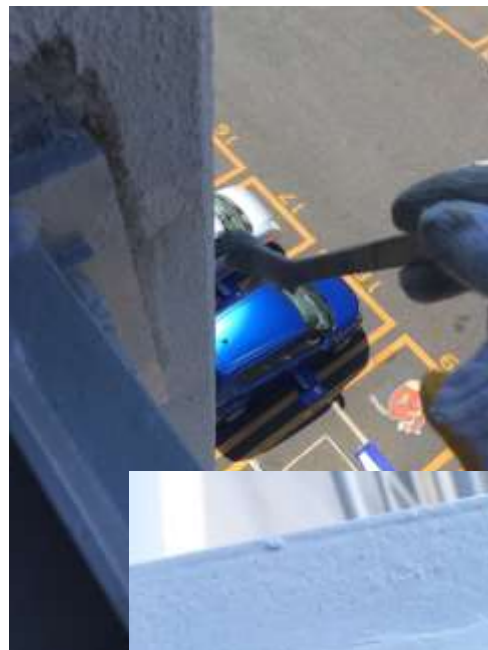

足場ばらし



完了

